土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　災害公営住宅建設に伴う測量調査業務委託(志賀地区その2)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　その他 構造物基礎

ボーリング名	BV-1	**調査位置**	羽咋郡志賀町高浜町 地内			**北緯**	37° 00′ 4.56″
発注機関	志賀町まち整備課			**調査期間**	2026年 4月 13日 ～ 2026年 3月 9日	**東経**	136° 46′ 47.04″
調査業者名	株式会社利水社 **電話** 076-238-9100	**主任技師**	森谷 司 地質調査技士 登録番号:	**現場代理人**	島田 淳一 地質調査技士 登録番号:	**コア鑑定者**	地質調査技士 登録番号:
						ボーリング責任者	梅田 謙司 地質調査技士 登録番号: 第17961号
孔口標高	DL= 8.98m	**角度**	180° 上 下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**試錐機**	東邦D-1
総削孔長	m	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 0°	**使用機種**		**エンジン**	ヤンマー NFD-13EK　**ポンプ** BG-3CL

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日
1				礫混じり砂		暗褐				細～中砂主体。 0.25m以浅、φ10～20mmのCo殻を混在。	
2	6.73	2.25				褐					
3				シルト混じり砂							
4						褐				細～中砂主体。	
5											04/14 6.40
6	2.28	6.70									
7	2.08	6.90		シルト質砂		褐～暗褐				シルト分を多く含む砂。	
8				シルト混じり砂							
9											
10						褐				中～粗砂主体。	
11											
12											
13											
14											
15	-6.52	15.50									
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

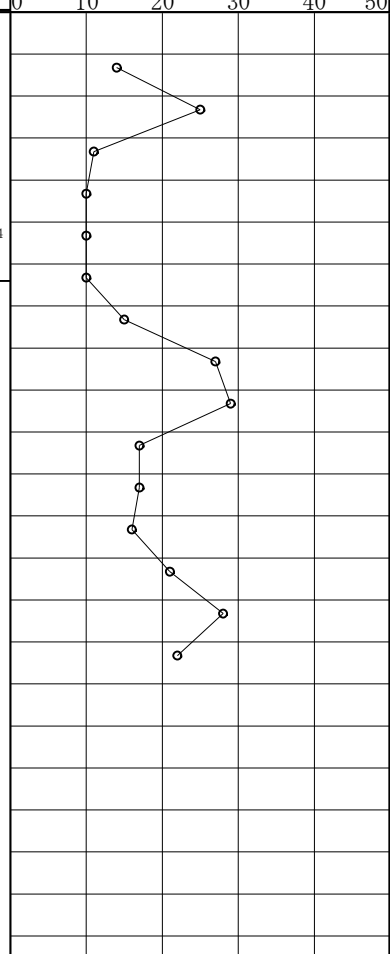

標準貫入試験								試料採取			室内試験	孔口位置試験	削孔月日
N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	深度 (m)	試料番号	採取方法			
14	1.15	4	5	5	14/300								
25	1.45 2.15	12	7	6	25/300								
11	2.45 3.15	3	4	4	11/300								
10	3.45 4.15	3	4	3	10/300								
10	4.45 5.15	3	3	4	10/300								
10	5.45 6.15	3	3	4	10/300								
15	6.45 7.15	4	5	6	15/300								
27	7.45 8.15	7	9	11	27/300								
29	8.45 9.15	9	10	10	29/300								4/13
17	9.45 10.15	6	5	6	17/300								
17	10.45 11.15	5	5	7	17/300								
16	11.45 12.15	6	6	4	16/300								
21	12.45 13.15	6	8	7	21/300								
28	13.45 14.15	9	9	10	28/300								
22	14.45 15.15	7	7	8	22/300								4/14
	15.45												
